



Infraestructura
y Obra Pública

Alcalde #1351, Colonia: Miraflores,
CP. 44270 Municipio: Guadalajara,
Edificio B

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

I.-Lugar, Fecha y Hora:

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00** horas del día **09 de Marzo de 2021**, se reúnen en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, edificio "B", colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, se constituye por parte de la **Dirección General de Infraestructura Carretera** el **Ing. Omar David Paredes Flores**, en su carácter de **Director General de Infraestructura Carretera**, el **Ing. Juan García Sánchez**, **Director de Conservación**, así como el **Ing. Jose Luis Ramirez Nuño**, **Residente de Obra**, y por parte del contratista **Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.**, el [REDACTED] 1
[REDACTED] 1, en su carácter de **Representante Legal**, quien acredita su personalidad con la escritura pública número **64317**, de fecha **04 de Abril de 1997**, pasada ante la fe del notario público **Lic. Protasio Guerra Ramiro**, de la municipalidad de **Distrito Federal**, México, y por último el [REDACTED] 1
[REDACTED] 1 en su carácter de **Responsable de Obra**, a fin de llevar a cabo el finiquito de los trabajos objeto del contrato número **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020** y hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, en apego a lo estipulado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los artículos 156, 157 y 158 de su Reglamento.

II.-Descripción de los trabajos:

CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO INTERIOR DE CIUDAD GUZMÁN, DEL KM 0+000 AL KM 3+700 (DE INGRESO SUR A LA GLORIETA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. FRENTE 1.

III.-Importe Contractual:

Para la ejecución de los trabajos materia del contrato número **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020**, se estipuló que el importe del mismo asciende a la cantidad de **\$13,231,403.71 (trece millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos tres pesos 71/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, como se detalla a continuación:

Monto del contrato incluyendo I.V.A.	\$13,231,403.71
Monto del convenio modificatorio	\$0.00
Monto total	\$13,231,403.71

IV.- Importe Real ejecutado:

El contratista, ejecutó trabajos que ascienden a la cantidad de **\$12,420,128.48 (doce millones cuatrocientos veinte mil ciento veintiocho pesos 48/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, por los volúmenes realmente ejecutados, tal y como se detalla en el resumen de generadores de cada una de las estimaciones pagadas por parte de este Centralizado Estatal, los cuales forman parte integrante del presente.



La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020** que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.**



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

V.-Importe de Anticipo:

Para el inicio de los trabajos se pactó la entrega de un anticipo correspondiente al **30%, (treinta por ciento)**, del importe total del contrato, que equivale a la cantidad de **\$3,969,421.11 (tres millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno pesos 11/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado.

VI.-Periodo de Ejecución:

Para la ejecución de los trabajos, el contratista se obligó a realizar los trabajos en un plazo de **120 días naturales**, debiéndose iniciar el día **11 de Diciembre de 2020** y debiéndose concluir el día **09 de Abril de 2021**.

VII.-Plazo en el que se ejecutaron:

La empresa contratista en referencia, realmente ejecutó los trabajos que le fueron encomendados en un plazo de **87 días naturales**, iniciándolos el día **11 de Diciembre de 2020** y concluyéndolos el día **07 de Marzo de 2021**.

VIII.-Relación de Pagos:

En cumplimiento a sus obligaciones contractuales, este Centralizado Estatal, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, le depositó al contratista en referencia, la cantidad de **\$3,969,421.11 (tres millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno pesos 11/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, por concepto de pago del anticipo, así como de las estimaciones 1 a la **3 (TRES finiquito)**, como a continuación se detalla:

CONCEPTO	MONTO PAGADO
Anticipo	\$3,969,421.11
Estimación No. 1	\$5,433,381.41
Estimación No. 2	\$2,908,609.60
Estimación No. 3 (TRES) finiquito	\$108,716.36

IX.- Datos de la estimación final:

El contratista, del monto contractual equivalente a **\$13,231,403.71 (trece millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos tres pesos 71/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, ejerció mediante las estimaciones 1 (uno) a la **3 (tres finiquito)**, la cantidad de **\$12,420,128.48 (doce millones cuatrocientos veinte mil ciento veintiocho pesos 48/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, amortizando del anticipo otorgado la cantidad de **\$3,969,421.11 (tres millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno pesos 11/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, como a continuación se detalla:



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

Estimación	Monto de Estimación	Anticipo Amortizado	Monto pagado
1	\$9,402,802.52	\$3,969,421.11	\$5,433,381.41
2	\$2,908,609.60	\$0.00	\$2,908,609.60
3 (TRES) finiquito	\$108,716.36	\$0.00	\$108,716.36

No habiendo pendientes, por lo que el saldo final es por la cantidad de **\$811,275.23 (ochocientos once mil doscientos setenta y cinco pesos 23/100 M.N.)**

X.- Penas Convencionales:

Para esta obra el contratista **Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.**, no incumplió en sus obligaciones contractuales, por lo que no se aplicaron penas convencionales.

XI.- Garantía de Vicios Ocultos:

El contratista en cumplimiento con lo establecido en el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, queda obligado a responder de los defectos que resultaren de los trabajos materia del presente, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable; para efecto de lo anterior garantizó los trabajos mediante póliza de fianza No. **BKY-0257-0086879** emitida por: **Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.**, misma que quedará vigente durante un plazo de doce meses a partir de la formalización del Acta de Entrega y Recepción de los trabajos, quedando a salvo los derechos de la Secretaría para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas, así mismo el contratista está de acuerdo en reintegrar las cantidades pagadas en exceso por parte de esta dependencia que no hubiesen podido ser detectadas con antelación al presente. De igual forma se hace constar que se ha devuelto la garantía del fiel y exacto cumplimiento número **BKY-0257-0061938** emitida por: **Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.**, del contrato número **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020**, la cual se ha sustituido por la garantía de vicios ocultos en referencia, así como la garantía de anticipo número **BKY-0257-0061955** emitida por: **Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.**

XII.- Declaraciones:

1.- El contratista **Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.**, declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 fracción X del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Quienes comparecen en la presente, manifiestan que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, lo anterior en apego a lo establecido en el último párrafo del artículo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020** que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.**



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

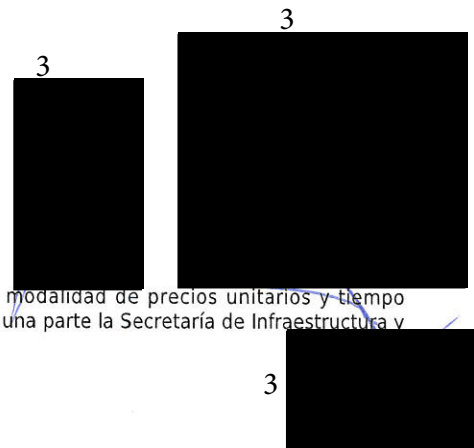
XIII.- Anexos:

1.- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se integra a la presente el Acta de Entrega y Recepción de los trabajos materia del presente, levantada con fecha **08 de Marzo de 2021**, en la cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se reservó el derecho para formar posteriores reclamaciones que se estimen convenientes en caso de detectarse defectos o vicios ocultos en los trabajos o de cualquier responsabilidad por parte del contratista, conforme a lo establecido en los artículos 111, 112 y 113 numeral 2, del ordenamiento legal en cita.

2.- Mediante oficio número **DC/0120/2021**, de fecha **08 de Marzo de 2021**, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, informó al contratista fecha, lugar y hora para el desahogo del presente, así como sus constancias de notificación.

3.- Resumen de generadores de cada una de las estimaciones cubiertas por este Centralizado Estatal.

Siendo las **14:00** horas del día de su inicio, estando de acuerdo con lo anterior y una vez que fue leída la presente y enteradas las partes de todos y cada uno de los alcances legales inherentes a la presente actuación y reconociendo que no existe dolo, error o mala fe por alguna de las partes, se estampa la rúbrica al margen y al calce en cada una de las fojas del presente por quienes aquí actuaron.









Infraestructura
y Obra Pública

Alcalde #1351, Colonia: Miraflores,
CP. 44270 Municipio: Guadalajara,
Edificio B

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

Por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Por el contratista Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.
	 3
Ing. Omar David Raredes Flores Director General de Infraestructura Carretera	1  Representante Legal
	3 
Ing. Juan García Sánchez Director de Conservación	1  Responsable de obra
	
Ing. Jose Luis Ramirez Nuño Residente de obra	

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Finiquito y Cierre de Obras

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica² y Firma³ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director de Finiquito y Cierre de Obras -----

