



Acta de entrega – recepción de obra pública al ente operador

I.-Lugar, Fecha y Hora:

En el municipio de Zapopan, Jalisco siendo las 12:00 horas del día 25 del mes de Octubre del año 2023 dos mil veintitrés, reunidos en el sitio donde se ejecutaron los trabajos de **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EES0501M, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 2"** como parte del contrato SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-197-2023 los cuales fueron realizados conforme a los planos, proyecto y especificaciones autorizadas; por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, la cual resulta ser la dependencia que entrega la obra materia de la presente, el **ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO**, en su carácter de Director de Construcción Infraestructura Metropolitana, el **ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA**, en su carácter de Director General de Construcción y por parte de la (Secretaría de Educación Jalisco), la cual resulta ser la dependencia que recibe la obra que nos ocupa, el **LIC. CARLOS GABRIEL GARCÍA RAMÍREZ**, en su carácter de Director de Secundaria General; interviniendo todos los presentes en la diligencia que se lleva a cabo, a fin de proceder por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con la entrega de los trabajos mencionados anteriormente, a la (Secretaría de Educación Jalisco) como ente operador de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 154 de su Reglamento. -----

II. Antecedentes:

1.-Esta obra se deriva de la necesidad de contar con infraestructura escolar segura, digna, funcional y de calidad en el estado de Jalisco y crear espacios óptimos de aprendizaje para los niños y niñas.-----

III. Descripción general de obra:

"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EES0501M, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 2."

Trabajos preliminares

Demolición de muros de cuarto de servicio en sanitarios del alumnado, desmantelamiento de mobiliario sanitario, retiro de instalaciones eléctricas, retiro puertas y ventanas de herrería; desmantelamiento de tubería hidrosanitaria, retiro de aplanchados, piso y firme en sanitarios. Apertura de calle en la Av. Circunvalación Oriente para la instalación de línea de oleajeamiento, demolición de antigua losa de estacionamiento, carga y acarreo de material producto de la demolición, acarreo a kilómetros subsecuentes.

Rehabilitación de sanitarios

Construcción de muro divisorio y muros frontales, ranurado de líneas hidrosanitarias, eléctricas; creación de registros sanitarios independientes fuera los baños y conectados a la red municipal. Aplanchado, emboquillado de muros, salidas eléctricas de centro, apagador y contacto. Instalación de accesorios eléctricos y lámparas. Suministro e instalación de ventanería de aluminio, vidrios y de protecciones de herrería según proyecto. Instalación de azulejo glossy en muros y piso tipo Sayulita. Elaboración de veredero para área de



Acta de entrega – recepción de obra pública al ente operador

aseo. Instalación de muebles de baños, retretes, mingitorios, fluxómetros, llaves en lavabos, barras para discapacitados. Suministro de barra de lavamanos con cubierta de granito, espejos, abastecedores de papel, jabón líquido, rejillas. Ramaleo de línea hidráulica desde cisterna, pasando por el cuarto del hidroneumático hasta llegar a los muebles sanitarios. Aplicación de pasta en muros para dar terminado apallado fino, suministro de pintura esmalte anticorrosivo a la estructura metálica, puertas y protecciones, de pintura vinílica en muros interiores y exteriores con los colores marcados por el área de proyectos. Suministro de señalética en puertas de los baños indicando sexos. Colocación de mamparas divisorias marca sanilock en color blanco. Instalación de equipo hidroneumático, conexión eléctrica y pruebas de hidrostática a 7kg. Suministro e instalación de puertas de herrería en sanitarios del alumnado y cuarto del hidroneumático. Colado de banquetta fuera de sanitarios y rampas para discapacitados con sellos de SIOP y Jalisco, suministro de perfil en cuarto de mantenimiento, tubería galvanizada, llaves de paso y colado de registros hidráulicos que alimentarán los sanitarios en el módulo B. Limpieza fina de tubería sanitaria.

Construcción de muro perimetral.

Excavación de N.P.T.-1.25m para cimentación de mampostería del muro perimetral de 53.00ml y 4.00m de altura, armado, cimbrado y colado de castillos y dadas de cimentación y coronamiento. Anclaje para instalación de malla ciclónica de 1.50m de altura en la parte superior del muro. Aplonado del muro, fondeado y pintado con tono blanco para motivos artísticos (murales). Compactado y limpieza del área en labores.

Áreas Generales.

Construcción de motivo de ingreso, suministro de escalones para el alumnado normal y rampas para personas con discapacidad; ramurado para suministro de instalaciones eléctricas, instalación de cancelería. Solicitación de permiso ante el municipio para la apertura de la Av. Circunvalación Oriente carril norte, suministro de señalética y visita del grupo de socialización a los vecinos para informarles acerca de la obra a realizar. Apertura en cepa con maquinaria pesada para 3 registros sanitarios y la instalación de línea de alejamiento N.P.T.-2.50m durante 70ml para la instalación de la tubería de PVC serie 20 de 8". Demolición de losa del estacionamiento y retiro de escombro a tiradero autorizado; relleno y compactación de línea de alejamiento con material de banco (tepetate) para después instalar el empedrado en la calle. Creación de 3 registros sanitarios e instalación de válvula check a uno de ellos para evitar nuevamente inundaciones en el plantel por aguas negras. Colado de cajetes exteriores, suministro de malla electrosoldada 6-6/10-10' y cimbra para colado de banquetta y losa del estacionamiento con sellos de SIOP y Jalisco. Instalación de barrera de protección, letrero de lámina de aluminio con el nombre del plantel, logo institucional, cancel corredizo, arbotantes, luminarias en piso y lámparas solares en la parte superior del motivo de ingreso. Aplicación de pintura esmalte anticorrosivo en toda la cancelería y pintura vinílica en repizones, muros laterales y cajetes. Retiro de señalización de obra en Av. Circunvalación oriente, limpieza fina de motivo de ingreso, estacionamiento, banquetta y empedrado.


IV.-Desahogo

del

Acto

En este momento los participantes en la presente diligencia, apoyados de sus respectivas áreas técnicas, proceden a realizar un recorrido por las instalaciones de la obra que nos ocupa, constatando que la misma se

Acta de entrega – recepción de obra pública al ente operador



encuentra debidamente concluida en su totalidad en todos sus aspectos y de acuerdo a los alcances establecidos en el/los contrato(s) de obra pública descrito(s) anteriormente, encontrándose la infraestructura en condiciones de operación; así mismo se observa su correcta funcionalidad, procediéndose a realizar la entrega oficial de la obra en comento, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, hace entrega a la (Secretaría de Educación Jalisco); por lo que a partir de este momento queda bajo su custodia y responsabilidad, debiendo realizar su conservación, mantenimiento y pagos de los servicios correspondientes, para efecto de mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento, así como su mejoramiento operativo y funcional. -----



V.-Manifestaciones:

1.- Los participantes de la presente diligencia manifiestan que en cumplimiento con lo establecido en el numeral 2, del artículo 115, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, recibe en este momento del responsable de la ejecución de la referida obra, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados y las constancias de los documentos derivados de la realización de los trabajos.-

2.- La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, manifiesta que existen fianzas de vicios ocultos sobre los trabajos realizados bajo el/los contrato(s) de obra pública antes referido(s), por lo que en caso de que surjan desperfectos, por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, vicios ocultos o en su caso por conceptos de obra cobrados no ejecutados, será necesario se informe de tal situación a esta dependencia, con el objeto de que la misma se encuentre en aptitud de reclamar las garantía otorgada por dichos conceptos, ante las Institución afianzadora respectivas. -----




Final:

No habiendo otro asunto o aclaraciones que hacer, se da por concluida la presente Acta de Entrega – Recepción física de los trabajos al ente operador, relativo al contrato “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EES0501M, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 2.” como parte del contrato SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-197-2023 siendo las 12:00 horas, del día 25 del mes de Octubre del 2023, previa lectura que se da a la presente, firmando al calce y al margen en cada uno de sus folios, las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. -----





Acta de entrega – recepción de obra pública al ente operador

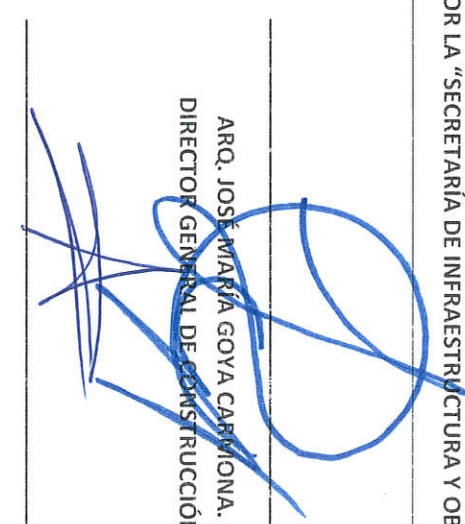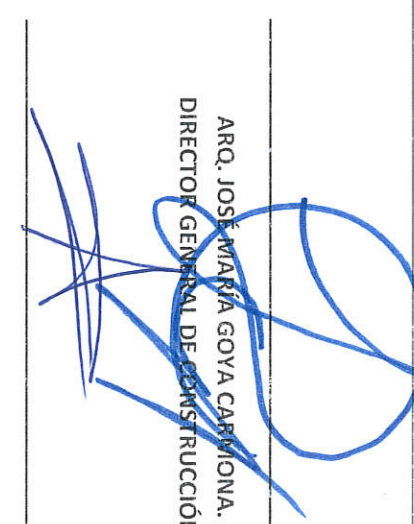POR LA "SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO"	
	
LIC. CARLOS GABRIEL GARCÍA RAMÍREZ DIRECTOR DE SECUNDARIA GENERAL	
POR LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL	
	
	
S. E. J. ESCUELA SECUNDARIA MIXTA No. 18 "MANUEL TORRES GARCÍA" C.C.T. 14EES0501M ZAPOLAN, JALISCO	
LIC. SALVADOR GÓMEZ TORRES DIRECTOR	
POR LA "SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA"	
	
ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA. DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN	
	
ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA	

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de entrega – recepción de los "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CCT 14EES0501M, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 2." Por parte de esta Secretaría de Infraestructura y Obra Pública al ente operador (Secretaría de Educación Jalisco), de fecha 25 del mes de Octubre del 2023.
