

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONCESIONADA MULTIANUAL MIXTO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS, Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS CARÁCTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN CONJUNTO CON LA AGENCIA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "LA AMIM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LUMA. ADRIÁN JEZHEL LÓPEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA OUTSIDE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ¹ [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15, 16 numeral 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 5, 6 fracción XIX, 9 fracciones IV y X, 11 fracciones XI y XVI, y 33 fracción XXI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a "El Contratista" como resultado del procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal con número de asignación SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020 instaurado por "La Secretaría", y el cual cuenta con Orden de Trabajo número LP-947-2020.

I.4. Que la Dirección Ejecutora encargada de la obra pública materia de este convenio es la Dirección General de Infraestructura Carretera de "La Secretaría".

I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificadorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y "La AMIM", y por otra parte la empresa Outside Publicidad, S.A. de C.V., consistente en 10 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 10 de marzo de 2021.

II.- "La AMIM" declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

II.1. Que es un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión de recursos, según lo establecido en la cláusula tercera del "Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara" y su Adendum, celebrados entre los municipios de El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo y Juanacatlán, todos del Estado del Jalisco, con fechas 26 de abril de 2019 y 14 de octubre de 2019 respectivamente; el convenio mencionado con antelación fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 17 de septiembre de 2019.

II.2. Que "La AMIM" se encuentra encargada de la planeación, elaboración, dirección, supervisión y ejecución de los proyectos y programas de carácter metropolitano en materia de infraestructura vial en el Área Metropolitana de Guadalajara y su mantenimiento, mismos que se encuentran definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), de conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del "Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara", enunciado en la declaración inmediata anterior.

II.3. Con fecha 19 de junio de 2019 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de "La AMIM", en la cual en su quinto punto del Orden del Día se designó como Administrador General de "La AMIM" al LUMA. Adrián Jezhel López González, al cual se le otorgaron facultades de representación y capacidad para obligar a "La AMIM", tal y como se asentó en el desahogo de su sexto punto, encontrándose, por ende, debidamente legitimado para la suscripción del presente convenio; nombramiento que a la fecha no le ha sido modificado ni revocado.

2

II.4. Con fecha 05 de octubre de 2020 la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara celebraron un Convenio de Coordinación y Colaboración para llevar a cabo las contrataciones y ejecuciones de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas, necesarias para el desarrollo del proyecto denominado **"Rehabilitación, mantenimiento y conservación rutinaria de nodos, puentes y túneles en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco"**, el cual tuvo por objeto establecer la coordinación de acciones entre los mencionados entes públicos, y las responsabilidades para cada uno de ellos, a fin de que de manera conjunta éstos llevaran a cabo todos los procedimientos de contratación de obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, así como de su supervisión, bajo el esquema de obra pública concesionada, que se requirieran llevar a cabo para el desarrollo del proyecto mencionado con antelación, solventado con recursos propios de personas del sector privado o social, en apego a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.5. Para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en la calle Félix Palavicini número 2068, en la Colonia Jardines Alcalde, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44298.

III.- "El Contratista" declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y "La AMIM", y por otra parte la empresa Outside Publicidad, S.A. de C.V. consistente en 10 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrita el día 10 de marzo de 2021.

III.1. Su representada, la sociedad denominada Outside Publicidad, S.A. de C.V., cuenta con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente convenio, así mismo, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 1,623 de fecha 27 de abril de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Carlos Vázquez Martín, Notario Público número 87 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 27284*1 de fecha 14 de julio de 2005.

1

4 III.2. El C. [REDACTED] quién se identifica con credencial de elector número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente convenio, acredita su carácter de Representante Legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 4,843 de fecha 14 de noviembre de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando López Vergara Corcuera, Notario Público Titular número 45 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 27284 de fecha 14 de diciembre de 2017; así mismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

III.3. Su representada cuenta con domicilio ubicado en la Avenida Vallarta No. 3024, en la Colonia Vallarta Norte, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44690, mismo que señala para que se le practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente convenio, y dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, la sociedad cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes número OPU050429E86.

2 III.4. Su representada se encuentra inscrita en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número C-1665, y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de formalización del presente convenio.

IV.- "Las Partes" declaran que:

IV.1. Con fecha 30 de noviembre de 2020 celebraron un Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, mediante el cual "La Secretaría" encomendó a "El Contratista" la ejecución de la obra pública concesionada denominada: **Rehabilitación, mantenimiento y conservación rutinaria de nodos, puentes y túneles en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3**, por un costo total de **\$41'665,472.96 (cuarenta y un millones seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 96/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligándose "El Contratista" a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de **1,400 días naturales**, debiendo iniciar los trabajos el día **01 de diciembre de 2020** y concluirlos el día **30 de septiembre de 2024**, conforme al calendario de obra entregado para la ejecución de la misma, siendo así que la contraprestación que recibiría "El Contratista" por la ejecución de los trabajos de rehabilitación inicial como de conservación

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y "La AMIM", y por otra parte la empresa Outside Publicidad, S.A. de C.V., consistente en 10 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 10 de marzo de 2021.



rutinaria sería el aprovechamiento de la infraestructura de los pasos a desnivel señalados en el Anexo 1 "Listado de los Pasos a Desnivel" para instalar la infraestructura publicitaria, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 4 "Lineamientos para la Instalación de Infraestructura Publicitaria", y comercializar los espacios para pautas de la misma índole durante al menos la vigencia del contrato, tal y como se manifestó en las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del contrato, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaran.

IV.2. En la cláusula cuarta del contrato en comento, se estableció que la ejecución de los trabajos se realizaría en cuatro etapas, las cuales se describen a continuación:

- 1. Etapa Preparatoria**, que comprende un periodo de **15 días calendario**, con fecha de inicio el día **01 de diciembre de 2020** y con fecha de término el día **15 de diciembre de 2020**.
- 2. Etapa de Rehabilitación Inicial**, que comprende un periodo de **90 días calendario**, con fecha de inicio el día **16 de diciembre de 2020** y con fecha de término el día **15 de marzo de 2021**.
- 3. Etapa de Conservación Rutinaria**, que comprende un periodo de **1,280 días calendario**, que inicia al día siguiente de la terminación de la Etapa de Rehabilitación Inicial y hasta el inicio de la Etapa de Devolución.
- 4. Etapa de Devolución**, que comprende un periodo de **15 días calendario**, a partir de la conclusión de la Etapa de Conservación Rutinaria y hasta concluir el contrato.

IV.3. Mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2021, "**El Contratista**" en apego a lo señalado en la cláusula trigésima tercera del contrato materia del presente, el artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 124 de su Reglamento, solicitó a "**La Secretaría**" la suspensión temporal de la obra objeto del contrato que nos ocupa, debido a que durante la ejecución de la "Etapa de Rehabilitación Inicial" se presentó una serie de acontecimientos de caso fortuito y/o fuerza mayor que afectaron la ejecución de los trabajos conforme a lo programado inicialmente, razón por la cual solicitó suspender la obra temporalmente, tal y como se expuso en el mencionado escrito, en donde se acompañó la documentación que dio soporte a su petición.

IV.4. Con fecha 26 de febrero de 2021, el Secretario de Infraestructura y Obra Pública emitió un Acuerdo en donde dio inicio al procedimiento de suspensión de la obra denominada: **Rehabilitación, mantenimiento y conservación rutinaria de nodos, puentes y túneles en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3**, correspondiente al Contrato de Obra Pública número **SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020**, y en el cual dio la instrucción al titular de la Dirección General de Infraestructura Carretera de "**La Secretaría**" de analizar la petición de "**El Contratista**" y la documentación anexa que dio soporte a la misma, para efecto de determinar su procedencia.

IV.5. La Dirección General de Infraestructura Carretera como área encargada de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra en comento, realizó el análisis correspondiente a efecto de determinar la procedencia de la solicitud de suspensión de la obra ya mencionada, por parte de "**El Contratista**", del cual dictaminó que resultaba procedente realizar la suspensión temporal de los trabajos objeto del contrato materia del presente, motivo por el cual mediante oficio número SIOP/DGIC/0241/2021 de fecha 03 de

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y "La AMIM", y por otra parte la empresa Outside Publicidad, S.A. de C.V., consistente en 10 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 10 de marzo de 2021.

marzo de 2021, informó al Secretario de Infraestructura y Obra Pública sobre esta situación, precisando las causas de caso fortuito y/o fuerza mayor que motivaban a realizar la mencionada suspensión de los trabajos, para que éste último determinara lo conducente.

IV.6. Derivado de lo anterior, el Secretario de Infraestructura y Obra Pública mediante el Acuerdo de fecha 05 de marzo de 2021, determinó que resultaba procedente realizar la suspensión temporal de la obra objeto del contrato que nos ocupa, solicitada por **"El Contratista"**, razón por la cual, designó al titular de la Dirección General de Infraestructura Carretera como el servidor público facultado para ordenar la suspensión de los trabajos, así como determinar su temporalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así mismo, en el mencionado Acuerdo el Secretario instruyó al titular de la Dirección General de Licitación y Contratación de **"La Secretaría"** de llevar a cabo la formalización del convenio modificatorio correspondiente.

IV.7. Posteriormente, el titular de la Dirección General de Infraestructura Carretera en apego a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley en cita, y la cláusula trigésima tercera del contrato que nos ocupa, mediante oficio número SIOP/DGIC/0298/2021 de fecha 08 de marzo de 2021, ordenó a **"El Contratista"** suspender temporalmente la obra en comento por un periodo de 180 días naturales, debido a lo manifestado en el escrito y oficio referidos en las declaraciones IV.3 y IV.5 del presente convenio, por lo cual se le citó al mismo en el sitio de ejecución de los trabajos para formalizar el acta de suspensión correspondiente.

IV.8. En virtud de lo anterior, el titular de la Dirección General de Infraestructura Carretera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 numeral 6 de la Ley en cita, y la cláusula trigésima tercera del contrato referido, mediante el "Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de Obra" de fecha 10 de marzo de 2021, ordenó a **"El Contratista"** suspender temporalmente la totalidad de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **Rehabilitación, mantenimiento y conservación rutinaria de nodos, puentes y túneles en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3**, asignada bajo el Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número **SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020**, por un periodo de **180 días naturales**, contados a partir del día **10 de marzo de 2021** al día **05 de septiembre de 2021**, señalando como fecha de reinicio de los trabajos el día **06 de septiembre de 2021**, no obstante, dado que la reanudación de los trabajos está ligada a un hecho de realización cierta, pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de éste, de conformidad con lo señalado en el artículo 108 numeral 2 de la Ley en cita, así como por las razones manifestadas en dicha Acta.

IV.9. Establecido lo anterior, se hace constar mediante el presente convenio, el diferimiento del periodo recalendarizado de **06 días naturales**, correspondiente al plazo de ejecución previsto para la "Etapas de Rehabilitación Inicial" con el que aún cuenta **"El Contratista"** para llevar a cabo la ejecución de los trabajos correspondientes a esta etapa, por un periodo de 180 días naturales, quedando como fecha de reinicio de los trabajos el día **06 de septiembre de 2021** y de término para esta etapa el día **11 de septiembre de 2021**; lo que hace necesario también, realizar la adecuación del periodo de ejecución previsto para la "Etapas de Conservación Rutinaria", el cual comprenderá de 1,100 días naturales, que iniciará al día siguiente de la fecha de término de la "Etapas de Rehabilitación Inicial" y concluirá el día anterior de la fecha de inicio de la "Etapas de Devolución", lo anterior, en el entendido de que no se modifica la fecha de término del plazo de ejecución del contrato de marras, pues continuará prevaleciendo como fecha de conclusión de la obra el día **30 de septiembre de 2024**.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y "La AMIM", y por otra parte la empresa Outsider Publicidad, S.A. de C.V., consistente en 10 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrita el día 10 de marzo de 2021.

En virtud de lo anterior, el plazo de ejecución de la obra objeto del contrato materia del presente, estará compuesto de la siguiente manera:

1. **Etapas Preparatoria**, que comprende un periodo de **15 días calendario**, con fecha de inicio el día **01 de diciembre de 2020** y de término el día **15 de diciembre de 2020**.
2. **Etapas de Rehabilitación Inicial**, que comprende un periodo de **90 días calendario**, con fecha de inicio el día **16 de diciembre de 2020** y de término el día **11 de septiembre de 2021**, (en virtud de la suspensión de obra de 180 días naturales, que tiene como fecha de inicio el día 10 de marzo de 2021 y de término el día 05 de septiembre de 2021, quedando como fecha de reinicio de los trabajos de esta etapa el día 06 de septiembre de 2021).
3. **Etapas de Conservación Rutinaria**, que comprende un periodo de **1,100 días calendario**, que inicia al día siguiente de la terminación de la Etapa de Rehabilitación Inicial y hasta el inicio de la Etapa de Devolución.
4. **Etapas de Devolución**, que comprende un periodo de **15 días calendario**, a partir de la conclusión de la Etapa de Conservación Rutinaria y hasta concluir el contrato.

Expuesto lo anterior, es necesario realizar la modificación de la cláusula cuarta del contrato de referencia, denominada "Plazo de Ejecución de las Etapas", con la finalidad de precisar la nueva fecha de término de la "Etapa de Rehabilitación Inicial" y la adecuación del periodo de ejecución previsto para la "Etapa de Conservación Rutinaria", para quedar en los términos descritos con antelación.

IV.10. Que el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que "**La Secretaría**", bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar los contratos mediante convenios, siempre y cuando éstos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley en materia.

2
[Redacted]
En virtud de lo anterior, se hace constar que las modificaciones que se realizan al contrato primigenio no varían el objeto de dicho contrato, ni se celebra para eludir lo dispuesto en la Ley en cita, sino que únicamente se reconoce el periodo de suspensión y reinicio de los trabajos que tendrá la obra en comento, y consecuentemente, realizar el diferimiento del plazo de ejecución de la obra, establecido en la cláusula cuarta del contrato que nos ocupa, sin que por ello se modifique la fecha de término del plazo de ejecución del contrato de marras, pues continuará prevaleciendo como fecha de conclusión de la obra el día 30 de septiembre de 2024, encuadrando con esto el supuesto legal previsto en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV.11. "Las Partes" en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, manifiestan su voluntad en celebrar el presente Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número **SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020**, otorgando su anuencia para reconocer el periodo de suspensión y reinicio de la obra denominada: **Rehabilitación, mantenimiento y conservación rutinaria de nodos, puentes y túneles en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3**, y consecuentemente, realizar el diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, establecido en la cláusula cuarta del contrato que nos ocupa.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y "La AMIM", y por otra parte la empresa Outside Publicidad, S.A. de C.V., consistente en 10 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrita el día 10 de marzo de 2021.



IV.12. Que las modificaciones que se realizan mediante el presente instrumento al Contrato de Obra Pública número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 y 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 125 y 127 de su Reglamento, en correlación con lo pactado en las cláusulas quinta, sexta, trigésima primera y trigésima tercera del contrato materia del presente.

IV.13. Se reconocen expresamente la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

IV.14. Con fundamento en los artículos 102 y 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 125 y 127 de su Reglamento, en correlación con lo pactado en las cláusulas quinta, sexta, trigésima primera y trigésima tercera del contrato, se reconoce el periodo de suspensión de la obra en comento, la fecha de reinicio de los trabajos, y, por ende, se modifica la cláusula cuarta del contrato de referencia, para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - El presente convenio tiene por objeto reconocer el periodo de suspensión y reinicio de la obra denominada: **Rehabilitación, mantenimiento y conservación rutinaria de nodos, puentes y túneles en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3**, correspondiente al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número **SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020**, y consecuentemente, realizar el diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, en igual proporción al periodo que comprenderá la suspensión de los mismos, así como, realizar la modificación de la cláusula cuarta del contrato en comento.

SEGUNDA. - RECONOCIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE OBRA. - Se reconoce que la obra denominada: **Rehabilitación, mantenimiento y conservación rutinaria de nodos, puentes y túneles en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 3**, correspondiente al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número **SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020**, será suspendida durante un periodo de **180 días naturales**, contados a partir del día **10 de marzo de 2021** al día **05 de septiembre de 2021**, estableciéndose como fecha de reinicio de los trabajos el día **06 de septiembre de 2021**.

TERCERA.- DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- Se difiere el periodo recalendarizado de **06 días naturales**, correspondiente al plazo de ejecución previsto para la "Etapa de Rehabilitación Inicial" con el que aún cuenta "**El Contratista**" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos correspondientes a esta etapa, por un periodo de 180 días naturales, quedando como fecha de reinicio de los trabajos el día **06 de septiembre de 2021** y de término para esta etapa el día **11 de septiembre de 2021**; lo que hace necesario también, realizar la adecuación del periodo de ejecución previsto para la "Etapa de Conservación Rutinaria", el cual comprenderá de 1,100 días naturales, que iniciará al día siguiente de la fecha de terminación de la "Etapa de Rehabilitación Inicial" y concluirá el día anterior a la fecha de inicio de la "Etapa de Devolución", sin que por ello se modifique la fecha de término del plazo de ejecución del contrato de marras, pues continuará prevaleciendo como fecha de conclusión de la obra el día **30 de septiembre de 2024**.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y "La AMIM", y por otra parte la empresa Outside Publicidad, S.A. de C.V., consistente en 10 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 10 de marzo de 2021.

CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS.- “Las Partes” acuerdan modificar la cláusula cuarta del contrato de referencia denominada “Plazo de Ejecución de las Etapas”, en cuanto al periodo de ejecución previsto para las etapas denominadas “Etapa de Rehabilitación Inicial” y “Etapa de Conservación Rutinaria”, sin que por ello se modifique la fecha de término del plazo de ejecución del contrato de obras, pues continuará prevaleciendo como fecha de conclusión de la obra el día **30 de septiembre de 2024**, por lo que la cláusula cuarta del contrato a partir de esta fecha quedará redactada de la forma que se describe a continuación:

“CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 1,220 días naturales, deberá iniciar los trabajos objeto de este contrato el día 01 de diciembre de 2020 y concluirá el día 30 de septiembre de 2024, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos, objeto de este contrato se realizará en cuatro etapas, como a continuación se describen:

1. **Etapa Preparatoria**, que comprende un periodo de **15 días calendario**, con fecha de inicio el día **01 de diciembre de 2020** y con fecha de terminación el día **15 de diciembre de 2020**.
2. **Etapa de Rehabilitación Inicial**, que comprende un periodo de **90 días calendario**, con fecha de inicio el día **16 de diciembre de 2020** y con fecha de terminación el día **11 de septiembre de 2021**, (en virtud de la suspensión de obra de 180 días naturales, que tiene como fecha de inicio el día 10 de marzo de 2021 y de término el día 05 de septiembre de 2021, quedando como fecha de reinicio de los trabajos de esta etapa el día 06 de septiembre de 2021).
3. **Etapa de Conservación Rutinaria**, que comprende un periodo de **1,100 días calendario**, que inicia al día siguiente de la terminación de la Etapa de Rehabilitación Inicial y hasta el inicio de la Etapa de Devolución.
4. **Etapa de Devolución**, que comprende un periodo de **15 días calendario**, a partir de la conclusión de la Etapa de Conservación Rutinaria y hasta concluir el contrato.

“El Contratista” se obliga durante la etapa mencionada en el párrafo inmediato anterior a realizar las actividades necesarias para preparar la entrega física de la infraestructura de los Pasos a Desnivel en las mismas condiciones en las que se entregó al término de la Rehabilitación Inicial.

La ejecución de los trabajos de las cuatro etapas deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el “Programa General de Ejecución de los Trabajos”, pactado en este contrato.

Para cumplir con los tiempos de la obra objeto de este contrato, “El Contratista” tendrá la obligación de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para la realización de las acciones o actividades al amparo del presente contrato, así como cumplir con los elementos

requeridos del Anexo 2 "Términos de Referencia", Anexo 3 "Alcance de los Trabajos" y Anexo 4 "Lineamientos para la Instalación de Infraestructura Publicitaria" durante toda la vigencia del contrato, deberá considerar también los turnos y horarios de trabajo necesarios para el cumplimiento del contrato.

No obstante, lo anterior previa petición por parte de "El Contratista" y análisis entre "Las Partes", de la situación que guarden los trabajos objeto del presente "La Secretaría" en apego a la norma aplicable, podrá extender la vigencia de este instrumento jurídico, siempre y cuando "El Contratista" haya dado puntual cumplimiento a cada una de las obligaciones que le son conferidas a través del presente."

QUINTA. - "Las Partes" acuerdan que en virtud de la suspensión y reinicio de la obra objeto del contrato que nos ocupa, los trabajos correspondientes a la misma se realizarán conforme a lo establecido en el "Programa de Ejecución de los Trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicial" y el "Programa de Ejecución de los Trabajos de la Etapa de Conservación Rutinaria", los cuales se anexan al presente convenio para formar parte del mismo.

SEXTA. - GASTOS NO RECUPERABLES. - "El Contratista" manifiesta que, en caso de generarse gastos no recuperables de los aludidos en el artículo 108 de la Ley en cita, por motivo de la suspensión temporal de obra reconocida en el presente instrumento jurídico, en este acto, renuncia a realizar cobro alguno por dichos conceptos, así mismo, manifiesta que no ejercerá acción legal alguna que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con la suspensión de obra materia del presente.

SÉPTIMA. - VIGENCIA. - "Las Partes" acuerdan que el presente convenio estará vigente a partir de su fecha de suscripción y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de "Las Partes" respecto del contrato primigenio, tal y como fue establecido en la cláusula trigésima novena del mismo.

OCTAVA. - "Las Partes" acuerdan en que el Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado que dio origen al presente convenio modificatorio queda vigente en todas sus partes a excepción de lo que expresamente se reconoce en este instrumento, por lo que los demás términos, condiciones, derechos u obligaciones previstos en el referido contrato, continúan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.

NOVENA. - "Las Partes" convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

DÉCIMA. - "Las Partes" manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Concesionada Multianual Mixto por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-MBP-OB-LP-947-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y "La AMIM", y por otra parte la empresa Outside Publicidad, S.A. de C.V., consistente en 10 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 10 de marzo de 2021.



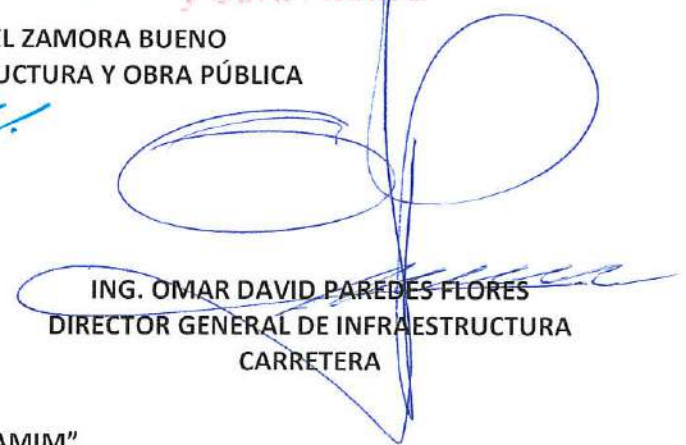
Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 10 de marzo de 2021.

POR "LA SECRETARÍA"


MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA


Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública


ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y
CONTRATACIÓN


ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA

POR "LA AMIM"


LUMA. ADRIÁN JEZHEL LÓPEZ GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

POR "EL CONTRATISTA"


C.  1
REPRESENTANTE LEGAL
OUTSIDE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

TESTIGOS


MTRO. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE
INFRAESTRUCTURA


LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTES LÓPEZ
DIRECTORA DE PRÓRROGAS Y CONVENIOS

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Prórrogas y Convenios

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica², Firma³ y Número de Identificación Oficial⁴ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Prórrogas y Convenios -----

